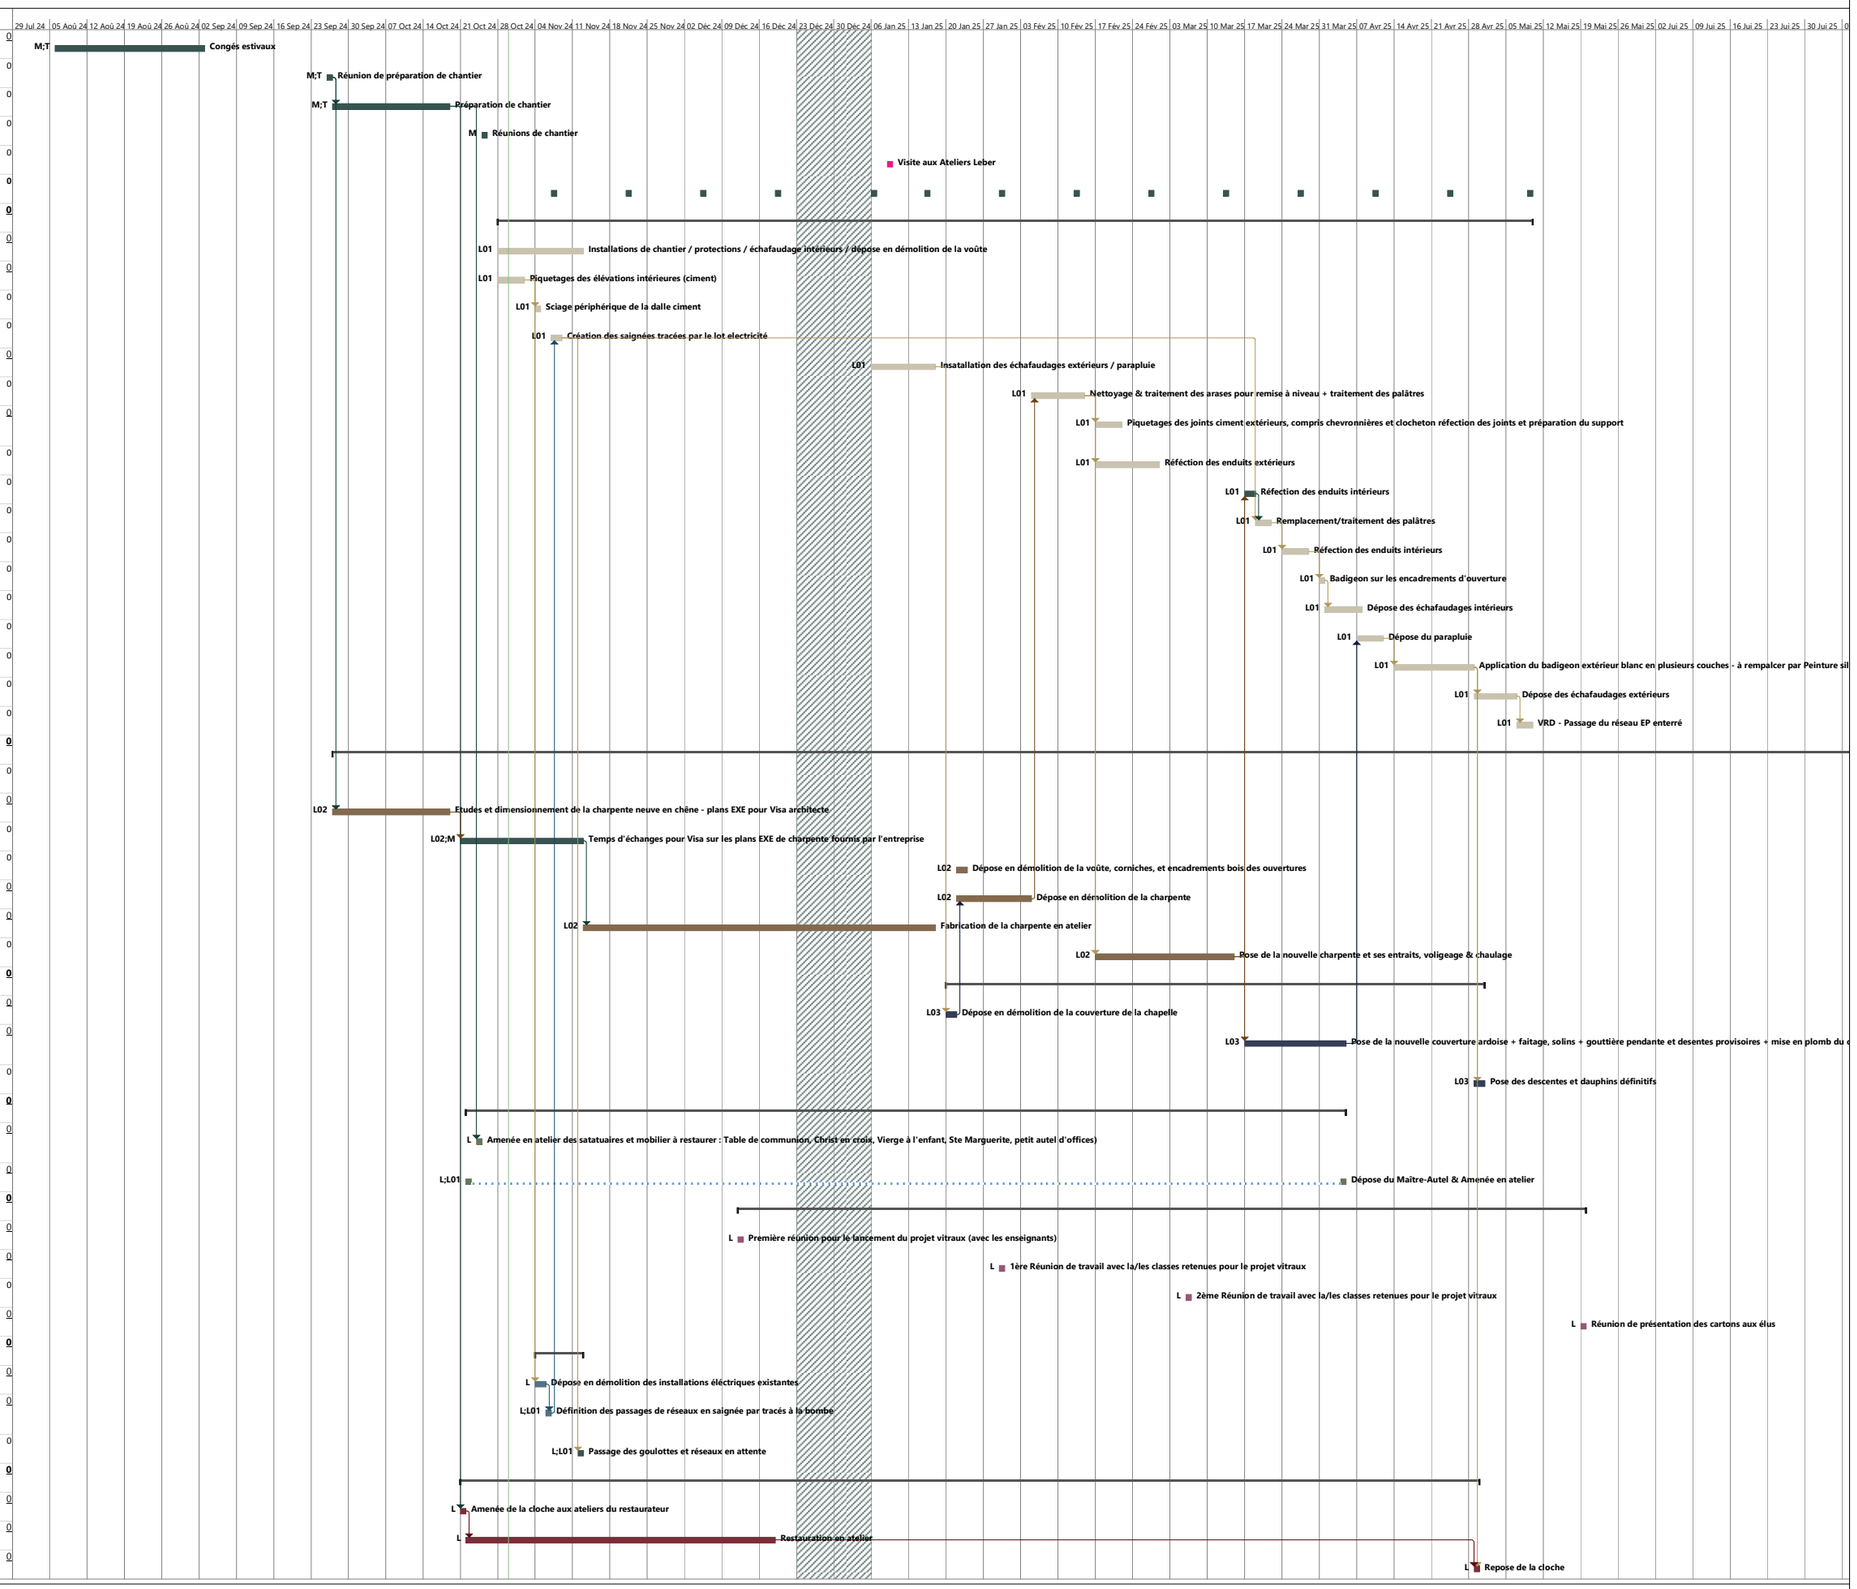N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéc	Success	Numéro1
1	Congés estivaux	20 jours	Mar 06/08/24	Lun 02/09/24			0
2	Réunion de préparation de chantier	1 jour	Jeu 26/09/24	Jeu 26/09/24		41;3	0
3	Préparation de chantier	16 jours	Ven 27/09/24	Ven 18/10/24	2	52;64;6	0
4	Réunions de chantier	1 jour?	Ven 25/10/24	Ven 25/10/24			0
5	Visite aux Ateliers Leber	1 jour	Jeu 09/01/25	Jeu 09/01/25			0
6	**Réunions de chantier bi-mensuelles**	**118 jours**	**Jeu 07/11/24**	**Ven 09/05/25**	**3**		**0**
21	**LOT 01 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - ECHAFAUDAGES**	**125 jours**	**Lun 28/10/24**	**Ven 09/05/25**			**0**
22	Installations de chantier / protections / échafaudage intérieurs / dépose en démolition de la voûte	10 jours	Lun 28/10/24	Mar 12/11/24			0
23	Piquetages des élévations intérieures (ciment)	4 jours	Lun 28/10/24	Ven 01/11/24		60;24	0
24	Sciage périphérique de la dalle ciment	1 jour	Lun 04/11/24	Lun 04/11/24	23		0
25	Création des saignées tracées par le lot electricité	2 jours	Jeu 07/11/24	Ven 08/11/24	61	31;62	0
26	Insatallation des échafaudages extérieurs / parapluie	10 jours	Lun 06/01/25	Ven 17/01/25		48	0
27	Nettoyage & traitement des arases pour remise à niveau + traitement des palâtres	8 jours	Mer 05/02/25	Ven 14/02/25	44	29;28;4	0
28	Piquetages des joints ciment extérieurs, compris chevronnières et clocheton réfection des joints et préparation du support	5 jours	Lun 17/02/25	Ven 21/02/25	27		0
29	Réfection des enduits extérieurs	10 jours	Lun 17/02/25	Ven 28/02/25	27		0
30	Réfection des enduits intérieurs	2 jours	Lun 17/03/25	Mar 18/03/25	46	31	0
31	Remplacement/traitement des palâtres	3 jours	Mer 19/03/25	Ven 21/03/25	25;30	32	0
32	Réfection des enduits intérieurs	5 jours	Lun 24/03/25	Ven 28/03/25	31	33	0
33	Badigeon sur les encadrements d'ouverture	1 jour	Lun 31/03/25	Lun 31/03/25	32	34	0
34	Dépose des échafaudages intérieurs	5 jours	Mar 01/04/25	Lun 07/04/25	33		0
35	Dépose du parapluie	5 jours	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25	49	36	0
36	Application du badigeon extérieur blanc en plusieurs couches - à rempalcer par Peinture silicate	10 jours	Lun 14/04/25	Lun 28/04/25	35	50;37;4	0
37	Dépose des échafaudages extérieurs	5 jours	Mar 29/04/25	Mar 06/05/25	36	38	0
38	VRD - Passage du réseau EP enterré	2 jours	Mer 07/05/25	Ven 09/05/25	37		0
39	**LOT 02 - CHARPENTE / MENUISERIE BOIS**	**264 jours**	**Ven 27/09/24**	**Jeu 23/10/25**			**0**
40	Dépose de l'estrade bois, compris lambourdes	2 jours	Mer 22/10/25	Jeu 23/10/25			0
41	Etudes et dimensionnement de la charpente neuve en chêne - plans EXE pour Visa architecte	16 jours	Ven 27/09/24	Ven 18/10/24	2	42	0
42	Temps d'échanges pour Visa sur les plans EXE de charpente fournis par l'entreprise	15 jours	Lun 21/10/24	Mar 12/11/24	41	45	0
43	Dépose en démolition de la voûte, corniches, et encadrements bois des ouvertures	2 jours	Mer 22/01/25	Jeu 23/01/25			0
44	Dépose en démolition de la charpente	10 jours	Mer 22/01/25	Mar 04/02/25	48	27	0
45	Fabrication de la charpente en atelier	38 jours	Mer 13/11/24	Ven 17/01/25	42		0
46	Pose de la nouvelle charpente et ses entraits, voligeage & chaulage	20 jours	Lun 17/02/25	Ven 14/03/25	27	49;30	0
47	**LOT 03 - COUVERTURE**	**72 jours**	**Lun 20/01/25**	**Mer 30/04/25**			**0**
48	Dépose en démolition de la couverture de la chapelle	2 jours	Lun 20/01/25	Mar 21/01/25	26	44	0
49	Pose de la nouvelle couverture ardoise + faitage, solins + gouttière pendante et desentes provisoires + mise en plomb du clocheton	15 jours	Lun 17/03/25	Ven 04/04/25	46	35	0
50	Pose des descentes et dauphins définitifs	2 jours	Mar 29/04/25	Mer 30/04/25	36		0
51	**LOT 04 - MENUISERIE - POLYCHROMIES**	**107 jours**	**Mar 22/10/24**	**Ven 04/04/25**			**0**
52	Amenée en atelier des satatuaires et mobilier à restaurer : Table de communion, Christ en croix, Vierge à l'enfant, Ste Marguerite, petit autel d'offices)	1 jour	Jeu 24/10/24	Jeu 24/10/24	3		0
53	Dépose du Maître-Autel & Amenée en atelier	2 jours	Mar 22/10/24	Ven 04/04/25			0
54	**LOT 05 - VITRAUX**	**100 jours**	**Jeu 12/12/24**	**Lun 19/05/25**			**0**
55	Première réunion pour le lancement du projet vitraux (avec les enseignants)	1 jour	Jeu 12/12/24	Jeu 12/12/24			0
56	1ère Réunion de travail avec la/les classes retenues pour le projet vitraux	1 jour	Jeu 30/01/25	Jeu 30/01/25			0
57	2ème Réunion de travail avec la/les classes retenues pour le projet vitraux	1 jour	Jeu 06/03/25	Jeu 06/03/25			0
58	Réunion de présentation des cartons aux élus	1 jour	Lun 19/05/25	Lun 19/05/25			0
59	**LOT 06 - ELECTRICITE**	**6 jours**	**Lun 04/11/24**	**Mar 12/11/24**			**0**
60	Dépose en démolition des installations éléctriques existantes	2 jours	Lun 04/11/24	Mar 05/11/24	23	61	0
61	Définition des passages de réseaux en saignée par tracés à la bombe	1 jour	Mer 06/11/24	Mer 06/11/24	60	25	0
62	Passage des goulottes et réseaux en attente	1 jour	Mar 12/11/24	Mar 12/11/24	25		0
63	**LOT 07 - ART CAMPANAIRE**	**124 jours**	**Lun 21/10/24**	**Mar 29/04/25**			**0**
64	Amenée de la cloche aux ateliers du restaurateur	1 jour	Lun 21/10/24	Lun 21/10/24	3	65	0
65	Restauration en atelier	40 jours	Mar 22/10/24	Mer 18/12/24	64	66	0
66	Repose de la cloche	1 jour	Mar 29/04/25	Mar 29/04/25	65;36		0
